heijmans

Reconstructie wegen Soperse Bos
Concept Planning

Startdatum: maa 17-5-10
Einddatum vri 2-7-10

Id	Taaknaam
1	**Voorbereidende werkzaamheden**
2	inrichten werkterrein
3	uitzetten Fresia
4	
5	**Bestaande onverharde wegen 2f, 2g, 2h, 2i en 2j**
6	grondwerk
7	aanbrengen opsluitbanden 620m1
8	aanbrengen puinbaan 1023m2
9	
10	**Asfalt onderlagen en tussenlagen op Fresia & Hyacinth**
11	**Aanbrengen asfalt (120 + 610 = 730 ton)**
12	
13	**Opbreekwerkzaamheden 2a, 2b, 2c, 2d en 2e**
14	zagen
15	opnemen rand asfalt
16	
17	**Aanbrengen kantopsluiting 2a, 2b, 2c, 2d en 2e**
18	grondwerk tbv grasbetontegels
19	aanbrengen menggranulaat tbv grasbetontegels 1310m1
20	aanbrengen grasbetontegels 1310m1
21	
22	grondwerk tbv opsluitbanden
23	aanbrengen opsluitbanden 220m1
24	
25	**Hyacinth**
26	uitzetten Hyacinth (in overleg)
27	zagen
28	opbreken rand asfalt
29	grondwerk tbv opsluitbanden
30	aanbrengen opsluitbanden +/- 750m1
31	
32	**Asfalt deklaag op Fresia & Hyacinth**
33	**Aanbrengen asfalt (460 ton)**
34	
35	**Overige werkzaamheden**
36	bermen afwerken en inzaaien
37	aanbrengen reflectorpalen
38	opruimen werkterrein

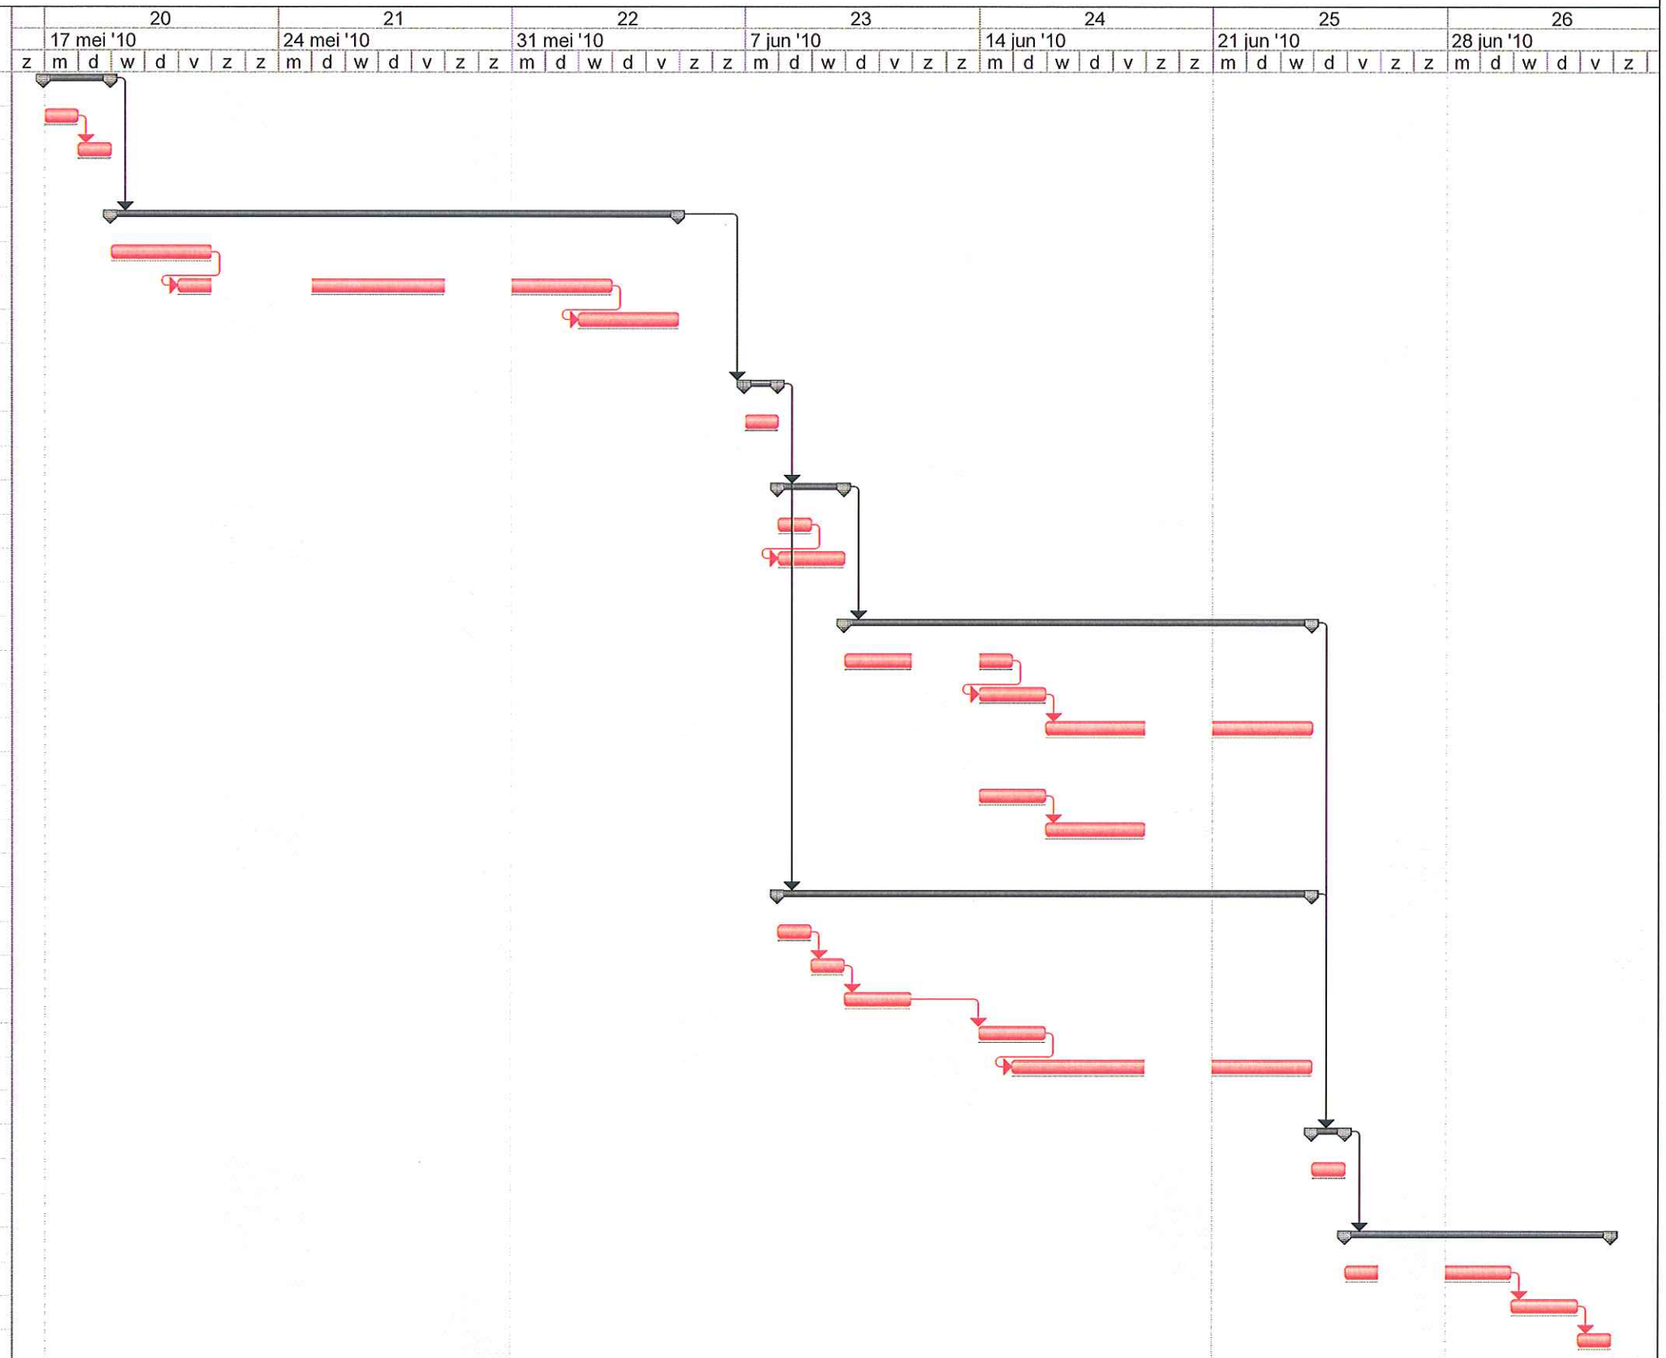

Kritiek | Taak | Samenvatting | Projectsamenvatting
